



VESUBIA MOUNTAIN PARK

TRAVAUX REALISES SUITE A LA TEMPETE ALEX

TRAVAUX DE SAUVEGARDE DE LA STRUCTURE DU BATIMENT DANS LES PREMIERS JOURS

- Dévoisement de la rivière
- Reprise en sous œuvre des massifs de fondations déchaussées (gros béton)
- Injection de béton dans le dallage intérieur pour combler les cavités créées par le ravinement sous le bâtiment

Pour un montant de :

- 509.000 € HT pour le dévoisement de la rivière sur la totalité du VMP
- Pour un montant de 234.000 € HT pour les fondations



TRAVAUX DE NETTOYAGE INTERIEUR NOVEMBRE – DECEMBRE 2020

- Nettoyage, désinfection et décontamination et assèchement de tous les locaux touchés et des équipements électriques
 - Évacuation des déchets
- Pour un montant de 767.000 € HT



TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA PISCINE

NOVEMBRE – DECEMBRE 2020

- Installation cuve fioul en aérien pour relancer la chaufferie puis enterrée en mai 2021
 - Remise en état du traitement d'eau et du traitement d'air de la piscine
- Pour un montant de :
67.000 € HT + 240.000 € HT relatif aux travaux d'enfouissement de la cuve



TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU
PARKING
+ (sous silo et berlinoise bâtiment)
DECEMBRE 2020 – JUIN 2021

- Mise en œuvre d'un béton projeté sur treillis ancré pour éviter l'érosion et stabiliser le talus et pour préserver la route métropolitaine au dessus

➤ Pour un montant de :
1.540.000 € HT + 310.000 € HT relatif à la zone 1 sous le silo bois/ berlinoise prise en charge par AXA





REMISE EN ETAT DES RESEAUX
INTERIEURS ET EXTERIEURS
NOVEMBRE 2020 – AVRIL 2021

- Curage de l'ensemble des réseaux et des drains sous dallage et de la berlinoise
- Création de nouveaux réseaux extérieurs pour les EP et les EU et des bassins tampons emportés par la crue
- Création d'une cunette béton en lieu et place du drain périphérique totalement embourbé
- Pour un montant de 543.000 € HT



TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES FONDATIONS DU BATIMENT AVRIL– JUIIN 2021



- Réalisation de 11 micro pieux de 150 mm sur 12 ml de profondeur par massif de fondation soit 77 micro pieux.
 - Réalisation de 22 tirants d'ancrage de 16 ml
 - Réalisation d'une longrine de répartition en béton.
- Pour un montant de 530.000 € HT

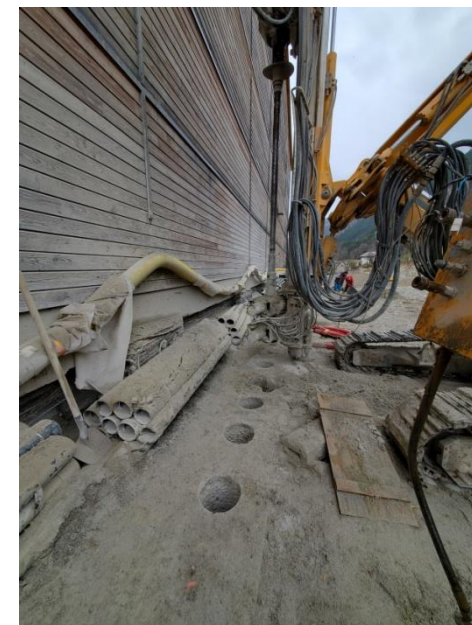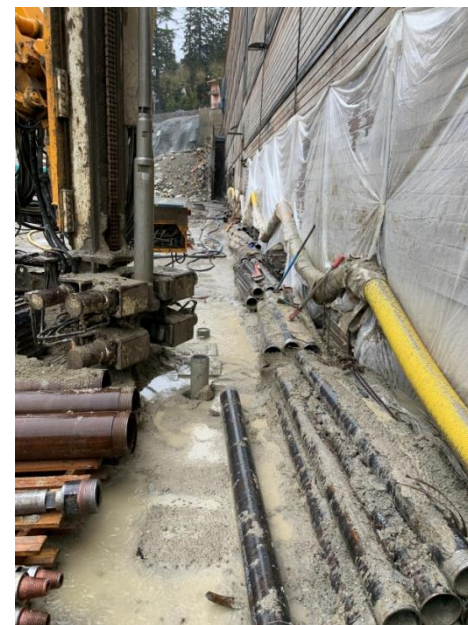

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES INTERIEURS


MARS - JUIN 2021

- Réfection des portes, sols souples, faux plafond et peinture
- Remise en état des flocage et tresses de joints de dilatation
- Remise en état de la grimpe ludique: sol souple et ateliers à réparer et à changer
- Remise en état des ascenseurs, notamment de l'ascenseur canyon
- Remise en état de la zone escalade : fixation parements bas, remplacement tapis de réception, création d'une nouvelle banque d'accueil

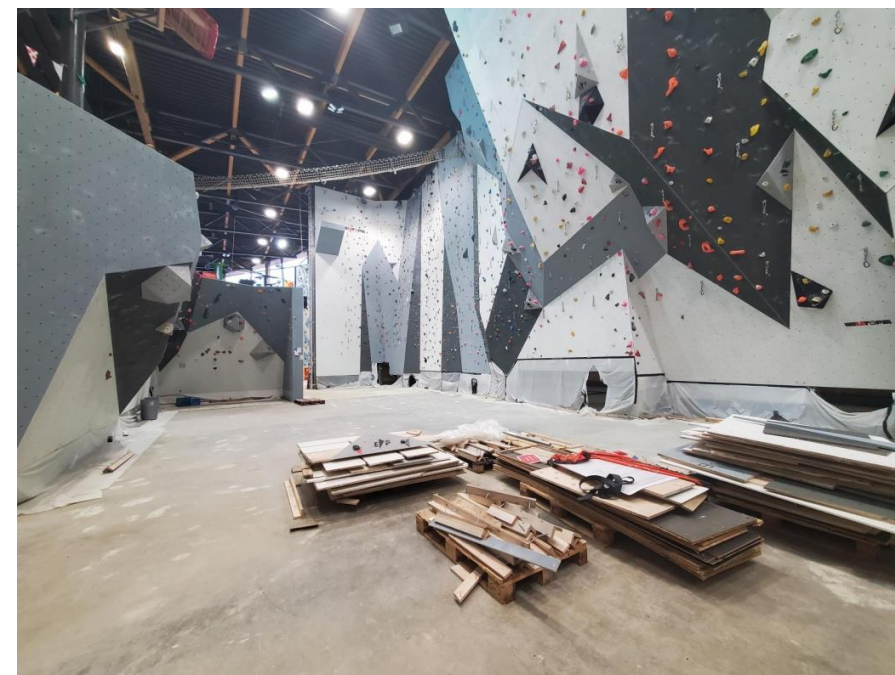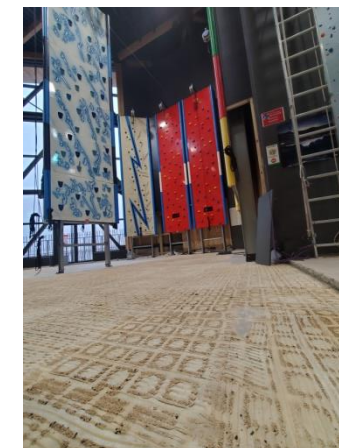

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES INTERIEURS MARS - JUIN 2021

- Remise en service du traitement d'eau du canyoning : système injection chlore, pompes de circulation, ...
 - Ensemble des contrôles réglementaires + remise en état (Désenfumage, SSI, Extincteurs, Contrôle d'accès, Colonne sèche, borne incendie...)
 - Vérification complète par organisme agréé de l'ensemble des installations électriques, thermographie comprise (Vésubia + salle Jean Grinda) prévue à partir du 17 mai
- Pour un montant de 345.000 € HT

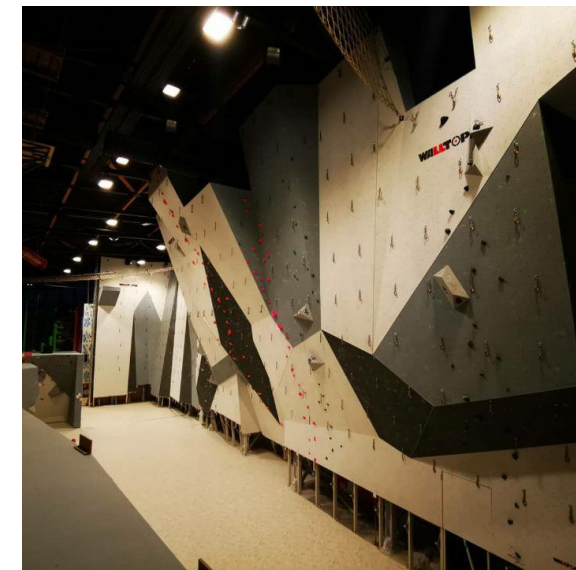

VESUBIA MONTAIN PARK
OUVERTURE AU PUBLIC
LE 19 JUIN 2021 (hors parking et travaux
smiage)

➤ Montant total des dépenses :
5,8 M€HT hors protections
**hydrauliques estimées à 1,4
M€HT**
(études et activité spéléo compris)

3,6 M€HT pris en charge par les
assurances

